


Stadt Schwäbisch Gmünd

Aktueller Stand zum Breitbandausbau

KUEBAS, 18.03.2026

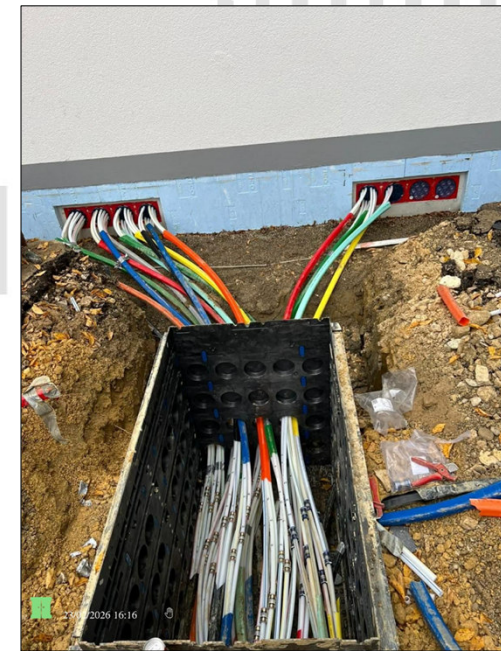

Quelle: TBG GmbH

Historie

- Geförderter Breitbandausbau („Weiße Flecken“)
 - 5 Lose mit ca. 2.700 förderfähigen Adressen (= ca. 4.500 Haushalte)
 - 90 %-Förderung durch Bund (50 %) und Land (40 %), 10 % städtischer Eigenanteil
 - Gesamtvolumen zuwendungsfähige Kosten: ca. 35,7 Mio. Euro
- Aufsplittung in Lose 1 – 3 und Lose 4 + 5:
 - Notwendig wegen zunächst nicht ausreichender Mittel im Haushalt 2024 - 2026
 - 10.04.2026: GR beschließt zunächst Ausschreibung der Lose 1 – 3 und spätere Ausschreibung der Lose 4 + 5, wenn die dafür erforderlichen Mittel im Doppelhaushalt 2026/2027 und für das Jahr 2028 vorgesehen sind
 - 17.07.2024: GR beschließt Vergabe an TBG GmbH
 - 23.08.2024: Vertragsunterzeichnung Stadt – TBG GmbH
 - 20.11.2024: Offizieller Spatenstich, seither Umsetzung der Lose 1 - 3
 - 25.03.2026: GR beschließt (voraussichtlich) Ausschreibung der Lose 4 + 5

Historie

Turbo-Internet für alle!
Das Bundesprogramm für superschnelles Breitband

Informationen unter
www.bundesfoerderung-breitband.de

Gefördert durch:
 Bundesministerium für Digitales und Verkehr
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

 Bundesförderung Breitband

 **aconium**
Projekträger

digital_LÄND

 Baden-Württemberg
MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

 Schwäbisch Gmünd
Zwischen Himmel und Erde


 **fairfast.de**
Internet • Telefon • TV • WLAN • Streaming

 **tbg gmbh**

 **OSTALBKREIS**

 **NetCom BW**

Historie

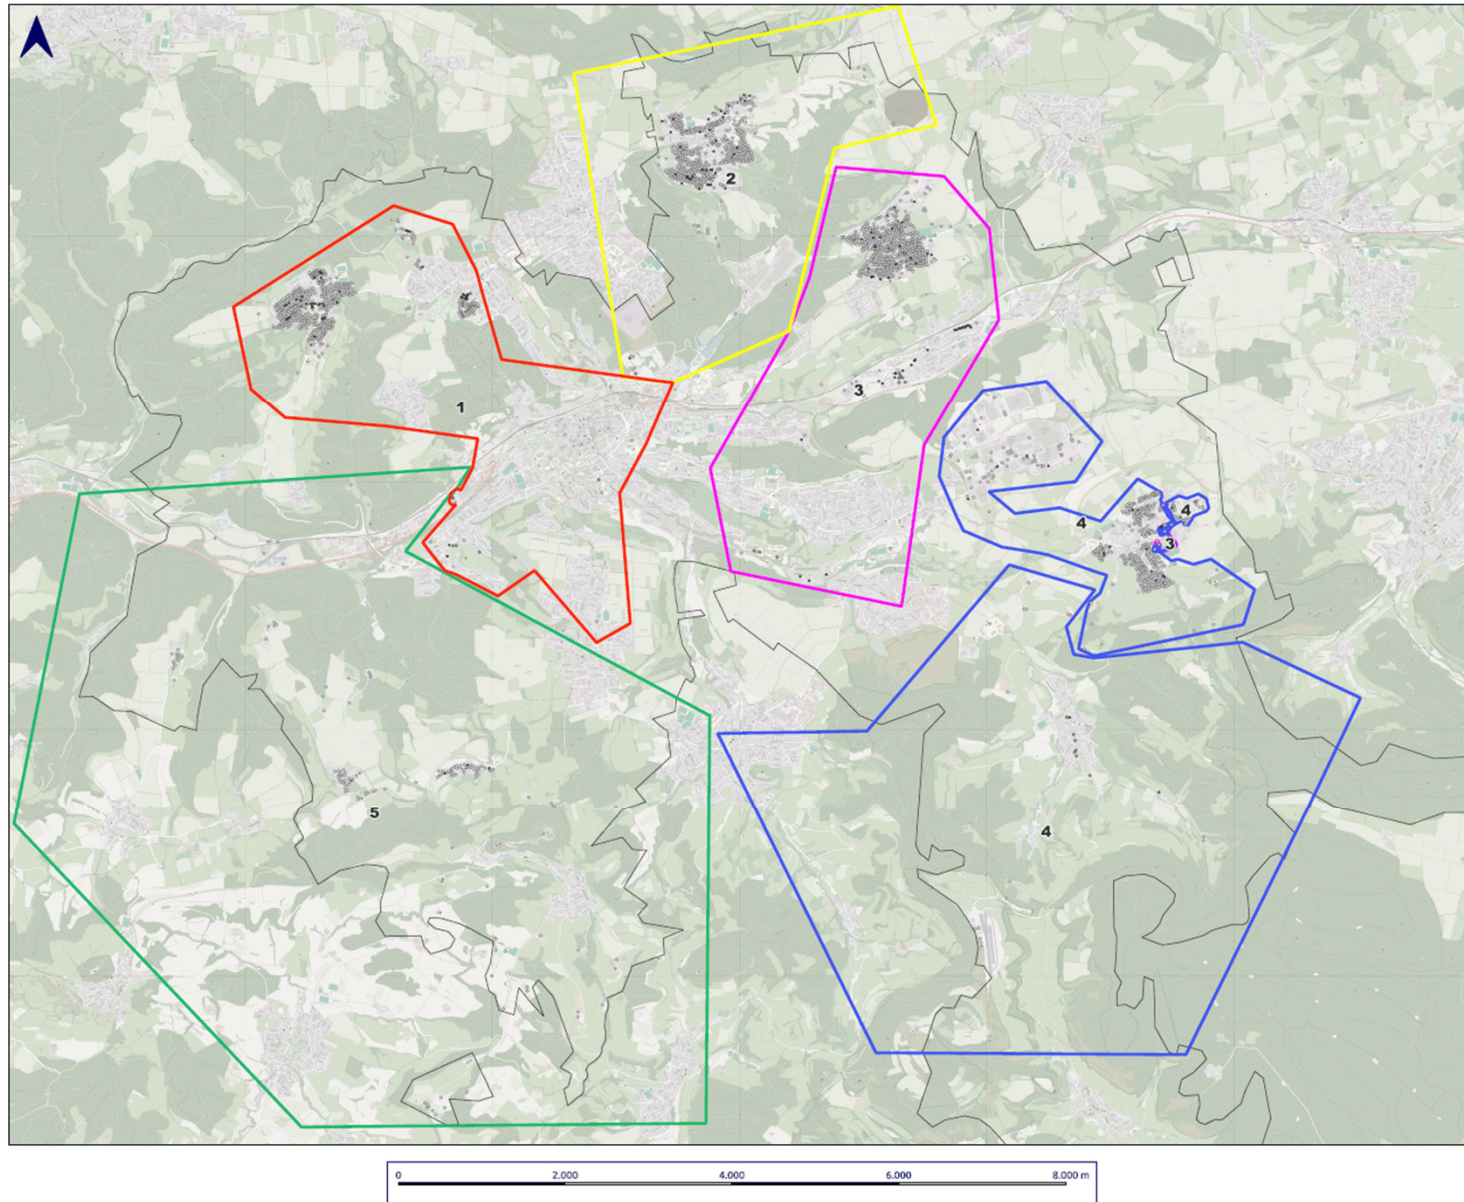

**Breitbandausbau
Schwäbisch-Gmünd
Ausbauadressen**

Ausbauadressen

- Weißer Fleck
- Hausanschluss
- hellgrauer Fleck
- Hausanschluss
- Vortriebsadresse
- Anschluss bis zum Grundstück

Baulose

- Los 1
- Los 2
- Los 3
- Los 4
- Los 5

Projekt: Breitbandausbau Schwäbisch-Gmünd
Datum: 04/03/2026
Koordinatensystem: ETRS89 / UTM32N
Format: A0
Hintergrundkarte: OpenStreetMap

**seim & partner**
eine Marke der s&p Beratungs-
und Planungsgesellschaft mbH
Bahnhofstraße 67, 65185 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 95011 - 900
Telefax: 0611 - 95011 - 999
Web: www.seim-partner.de

Aktueller Stand Lose 1 - 3

Los 1 (Großdeinbach):

- 698 förderfähige Adressen, davon:
 - 651 Glasfaser-Hausanschlüsse („Weiße Flecken“ und „Hellgraue Flecken“)
 - 47 Vortriebe („Dunkelgraue Flecken“)
- Aktuell hergestellt:
 - 619 Hausanschlüsse, davon 7 Schulen (= 95 %)
 - bisher 15,5 km Tiefbau auf öffentlichem und 5,4 km auf privatem Grund
 - Nutzung von 2 km Bestandstrasse
 - Errichtung von 26 NVTs und 1 PoP-Station



Quelle: TBG GmbH

Aktueller Stand Lose 1 - 3

Los 2 (Lindach):

- 614 förderfähige Adressen, davon:
 - 575 Glasfaser-Hausanschlüsse („Weiße Flecken“ und „Hellgraue Flecken“)
 - 39 Vortriebe („Dunkelgraue Flecken“)
- Aktuell hergestellt:
 - 486 Hausanschlüsse, davon 3 Schulen (= 85 %)
 - bisher 14,0 km Tiefbau auf öffentlichem und 4,6 km auf privatem Grund
 - Nutzung von 1,4 km Bestandstrasse
 - Errichtung von 19 NVTs und 1 PoP-Station



Quelle: TBG GmbH

Aktueller Stand Lose 1 - 3

Los 3 (Herlikofen):

- 680 förderfähige Adressen, davon:
 - 645 Glasfaser-Hausanschlüsse („Weiße Flecken“ und „Hellgraue Flecken“)
 - 35 Vortriebe („Dunkelgraue Flecken“)
- Aktuell hergestellt:
 - 460 Hausanschlüsse, davon 3 Schulen (= 71 %)
 - bisher 11,3 km Tiefbau auf öffentlichem und 3,7 km auf privatem Grund
 - Nutzung von 3,4 km Bestandstrasse
 - Errichtung von 17 NVTs und 1 PoP-Station



Quelle: TBG GmbH

Aktueller Stand Lose 1 - 3

- Bauüberwachung im Rahmen der Leistungsphase 8 durch s&p
- Schätzung s&p: Abschluss 3 Monate schneller als ursprünglich geplant (bisher: Mitte November 2026)
- Bisherige Ausgaben für Tiefbau, Montage und Materiallieferung :
 - ca. 13,4 Mio. Euro von ca. 16,9 Mio. Euro = 78 %
- Stetiger und zeitnaher Mittelrückfluss:
 - seit 2022 bisher 10 Mittelabrufe über Gesamtsumme i. H. v. 14.365.432,18 Euro (zuwendungsfähige Ausgaben)
 - Gemäß Fördersatz Auszahlung i. H. v. 12.928.888,90 Euro



Quelle: TBG GmbH

Weitere Vorgehensweise Lose 4 + 5

Nächste Schritte:

- Fertigstellung LV + Abstimmung Synergieeffekte mit Breitband Ostalb KAÖR
- Europaweite Ausschreibung (geschätzte Kosten: ca. 14,5 Mio. Euro)
- Vergabe
- Vertragsunterzeichnung
- Kick-off Bau
- Bau anhand noch zu erstellendem Zeitplan
 - Los 4 (Bargau):
 - 488 förderfähige Adressen (464 Hausanschlüsse + 24 Vortriebe)
 - 30,6 km Trasse
 - Los 5 (Metlangen + Reitprechts):
 - 157 förderfähige Adressen (152 Hausanschlüsse + 5 Vortriebe)
 - 31,4 km Trasse

Beschlussantrag

Der Gemeinderat beschließt, für die **Teilbereiche Lose 4 + 5** Leistungen für Tiefbau, Montage und Materiallieferung für die Errichtung eines FTTB-Netzes in unterversorgten Gebieten im Projektgebiet der Stadt Schwäbisch Gmünd im Rahmen eines sogenannten Betreibermodells mit einer **geschätzten Summe (Netto) von rund 14,5 Mio. € europaweit auszuschreiben**. Der voraussichtliche städtische Eigenanteil beträgt hiervon 10 %, also rund 1,45 Mio. €.

Die Ausschreibung erfolgt erst nach Genehmigung des städtischen Doppelhaushalts 2026/2027 durch das Regierungspräsidium Stuttgart.
